

COMPONENTES DE UN PROJ. DE SFTW

> PLAN DE PROYECTO → Documenta qué, cuándo, cómo y quién.

→ Objetivo del Proyecto: ¿Qué?

↳ Cbro.
↳ Alcanzable.

→ Alcance del Proj: Todo y solo el trab. q' es nec. realizar p/ cumplir c/ el obj. del proy.

→ Alcance del Producto: Todas las caracts. del prod o servicio.

→ Como se miden?

PROY → contra el plan de proyecto

PROD → contra la ERS → doc. q' describe formalmente todo lo q' debe hacer el SFTW y como debe hacerlo.

→ Definir el proceso de desarrollo y ciclo de vida: ¿Cómo?

→ Definir el equipo de Proyecto: ¿Quien? (asume las resp).

→ ESTIMACIÓN → No es compromiso, es probabilidad. En proc. definidos hay pasos p/ estimar

> Tamaño → del Producto.

Mide q' tan grande es lo q' hay q' construir. Pertenecce al Producto xq' no depende de quien lo haga. C.U. x Complejidad.

> Esfuerzo → del Proyecto

Mide cuantos Hs-PAX lleva construir ese tamaño. Depende del equipo, su xp y la tecno. x' eso es de Proyecto

> Tiempo (calendario) → del Proyecto

Mide cuantos días o semanas pasan. No es igual al esfuerzo xq' nadie trabaja el 100% de su jornada. Hs productivas → 6H en 8H

> Costo

Sale sobre todo del esfuerzo, q' es lo + significativo (80% las Hs de las pax). A eso se suma 10% conectividad y 10% de otros costos

> Recursos Críticos

Son los recursos escasos de los q' depende el proy. y q' tmb. hay q' estimar. Ej: Ancho de Banda, Servidor, Especialista.

► Consideraciones: la estimación no es precisa, estimar no es planear y no es un compromiso.

► Cono de Incertidumbre: al inicio del proy. el error va de 4x a 0.25x y se achica a medida q' avanza.

► Métodos de Estimación:

- Basados en XP (datos históricos, juicio experto y analogía).
- " en Recursos
- " en el Mercado
- " en los comp. del prod o en el proc.
- Algorítmicos


► JUICIO EXPERTO: más usado

- > Puro: un experto estima solo; si se va, la emp. deja d' estimar.
- > Wideband Delphi: Grupo de expertos estiman de forma anónima y se repite hasta q' convergen las estimaciones
- > Se estructura c/ la fórmula
$$(\text{optimista} + 4 \times \text{habitual} + \text{pesimista}) / 6$$

TRIPLE RESTRICCIÓN → Alcance, Tiempo y Costos. Su balance afecta a la **CALIDAD** del proy. y es responsabilidad del líder de Proyecto equilibrarlas.

TRIANGULO DE HIERRO

(PROC. DEF.)




Debo controlar 2 (Alcance) no puedo xq' vienen del cliente)

► Plantea q' debo controlar 2 de esas vars. y si viene el cliente a cambiarme algun req. debo derivar esos cambios a Tiempo y/o Costos.

► AGILISMO INVIERTE EL Δ.

Plantea dejar fijo el tiempo (iteración) y cumplirle al cliente. Pero negocia los alcances o C.U. (p/ esa iteración).

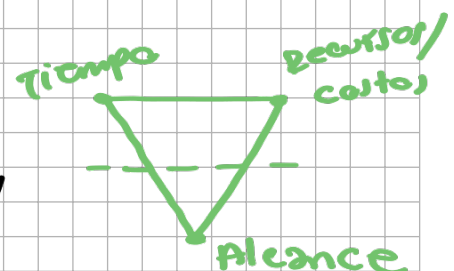

ITERACIÓN

Alcance Fijo

→ PUD ⇒ Neg Tiempo y Costos

Duración Fija

→ SCRUM (TimeBox) ⇒ Negocio los alcances.

- Calendarización: Def. cuando se hace c/ tarea y quien la hace. En proc. definidos la asignación es PUSH (líder asigna las tareas). En Agile es PULL (c/ miembro toma las tareas). 1pa1 ≠ entre los dos.
- Riesgos: Problemas esperando p/ suceder. Se gestiona c/ el ciclo Identificar → analizar → planif. → seguimiento y control
- Seguimiento y Control: Comparar lo planif. vs lo real y corregir desvíos.
- Métricas: De proy, proc y prod. Las 4 básicas son: tamaño, esfuerzo, tiempo y defectos
